



广汽传祺 APP 体验优化项目

技术规格书

批准	审核	制作
		

2024-12-16

广汽传祺汽车销售有限公司 用户生态部

目录

1 文档介绍	1
1.1 文档目的	1
1.2 文档范围	1
1.3 通用条款	1
2 项目介绍	1
2.1 项目背景	1
2.2 项目方案	2
2.3 项目基本信息	3
2.4 进度计划	4
2.5 项目目标	4
2.6 供应商资质要求	5
2.7 服务要求	6
3 项目范围	6
3.1 用户范围	6
3.2 业务范围	7
3.3 系统上线	12
4 技术规范	12
4.1 应用架构	13
4.2 配置管理	14
4.3 系统安全	14
4.4 系统集成	15
4.5 技术要求	16
4.6 知识产权	17
5 项目管理	17
5.1 RASIC	18

5.2 人员管理	21
5.3 版本管控	25
5.4 计划管理	26
5.5 风险管控	26
5.6 质量管控	26
5.7 测试管理	27
5.8 变更管理	29
5.9 保密协议	29
6 项目交付	29
6.1 交付物	29
6.2 知识转移	33
6.3 运维交接	33
6.4 运维/质保服务	34
6.5 验收标准	34
6.6 进度保证条款	35

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档是广汽传祺 APP 体验优化项目招标要求详细说明文档，必须列出项目范围、技术规范、项目实施交付要求等信息，以保证供应商能按要求提供合格的服务实施项目满足项目业务的需求。

1.2 文档范围

本文档主要内容包括项目介绍、项目范围、技术规范、项目管理标准、项目交付标准。

1.3 通用条款

我们需要供应商非常准确、清楚地在方案中包含全部本文档列出的功能和交付物的全部功能：任何不符之处或者排除的活动/功能必须单独一章标注出来。

2 项目介绍

2.1 项目背景

随着汽车行业 APP 业务新增流量红利淡化，广汽传祺 APP 用户增速和营销转化放缓。而同业新势力车企用【App + 体验店】服务体验模式，以 APP 成为新势力车企的核心服务渠道，通过优化线上线下载体联动服务体验，显著提高客户全生命周期的服务满意度和营销效果，走出了强劲增长态势。且持续加大 VR、AI 新技术的应用，不断创新 APP 体验水平。客户对 APP 服务体验提出更高要求，但广汽传祺 APP 客户体验表现不佳，2024 年 APP 集团竞赛仅第二名。

集团对 APP 提出「服务专家、销售专家、市场专家、数字平台、交友平台、官方代表」的「六个专家」战略要求，均直指 APP 体验提升要求，需不断升级 APP 的服务体验。同时，在 APP 的超伙 KOC 的运营均由运营人员线下进行管控，包括了对 KOC 的用户任务，完成情况效果分析等，缺少了系统线上工具管控，导致运营人员需要投入大量工作进行 KOC 用户运营。另外，超级合伙人 PGC 阅读量持续走低，且用户反馈转发路径过长，一定程度上影响品牌私域的发帖、互动、推荐等，导致促

进转化低。现当务之急，广汽传祺 APP 需基于客户生命周期全旅程梳理优化体验问题，全面提高客户服务体验。

2.2 项目方案

全面诊断广汽传祺 APP 的体验现状，多维度梳理体验优化课题，结合短期快速可实施的目标，提出针对课题的体验优化方案，以确保快速客户体验问题和提升 APP 体验水平。

项目还需从内部战略侧、客户诉求侧、项目实施侧等多方面调研和收集体验问题，从功能架构、交互设计（含 UX 和 UI）、营销能力、产品性能四方面梳理体验相关课题并形成体系的体验提升实施方案。

2.2.1 体验问题调研

- (1) 内部调研：收集内部业务、产品、开发等相关团队对 APP 优化的反馈意见；
- (2) 客户问卷研究：收集客户使用线上服务渠道（传祺 APP、小程序、官网）的体验问题；
- (3) 体验问题总结：结合诊断结论，全面梳理广汽传祺 APP 的体验问题和初步解决思路；

2.2.2 体验概要方案

- (1) 整体功能框架输出及评审

结合调研分析结论，确定体验优化策略，优化关键页面服务定位、功能架构、页面交互和视觉风格

- (2) 概要方案确定

结合方案评审及讨论，组织利益相关团队持续共创，推进达成各方共识的最终方案

2.2.3 体验设计实施推进

- (1) 交互设计

基于整体体验优化方向，分场景（如全量一级页面、售前场景、售后场景、社区运营、商城及账户相关等）细化整体 APP 的交互设计

- (2) 视觉设计

结合视觉风格策略和运营提供素材的能力，分场景（同交互部分范围）细化视觉页面和交互动效。

（3）体验设计规范

基于确定上线方案，梳理广汽传祺 APP 的新版本 UI 设计规范及内容配置规格规范。


2.2.4 开发实施：根据设计方案进行开发实际，1:1 还原设计效果，确保设计方案落地。

2.2.5 视觉效果走查：针对测试环境的上线情况进行还原度走查。

2.2.6 诊断分析

针对产品设计方案开展诊断与评价工作，深入剖析其优劣，提出专业且极具建设性的建议，确保产品设计紧密契合车企的独特使用规范与高标准要求。聚焦广汽传祺 APP 展开深入的定性与定量研究，通过严谨的数据采集、细致的分析模型构建以及全面的趋势洞察，最终输出详尽且极具参考价值的完整车联网诊断报告，为广汽传祺在汽车领域的 APP 战略决策、技术升级与用户体验优化提供有力支撑与明晰方向。

2.2.7 超伙 KOC 优化提升：建设超伙 KOC 运营板块与特定权益板块，结合超级合伙人的传播、共创任务，打造打造 KOC 从应用到传播全体系的业务闭环。

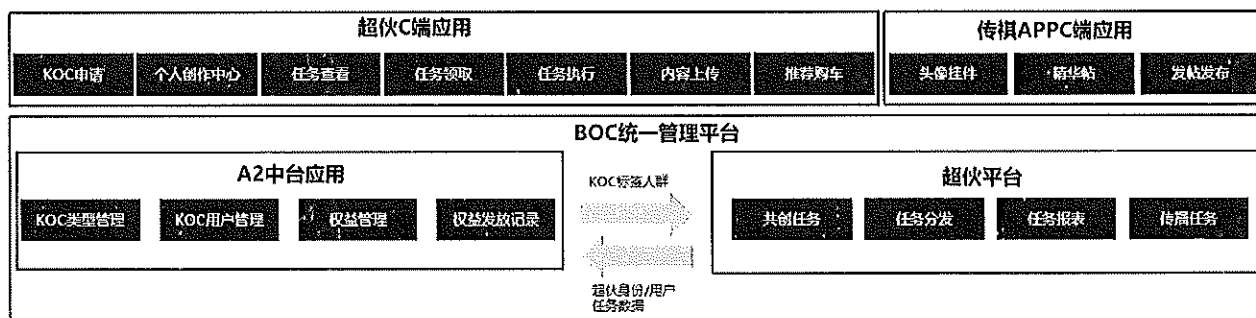

2.3 项目基本信息

- **项目名称：**广汽传祺 APP 体验优化项目
- **项目简述：**本项目为广汽传祺 APP 体验优化项目基于当前存在的课题，从客户购车、用车、谈车的全生命周期旅程，结合行业发展趋势和 APP 自身战略定位，构建起一套科学、系统且具有高度实操性的评价体系，并提出体验提升实施方案，提高 APP 用户体验。

- **项目组织：**广汽传祺汽车销售有限公司、广汽传祺汽车有限公司及子公司等；
- **项目地点：**广东省广州市番禺区化龙镇金山大道东 633 号，可能出差广汽传祺各分子公司、销售大区所在地及部分关键经销商所在地。项目实施团队必须在项目地点现场办公，正常工作时间和广汽传祺办公时间一致；

2.4 进度计划

项目推进计划如下（T 代表合同签订时间）

序号	服务系统	服务周期
1	广汽传祺 APP 诊断及问题分析	T+5 自然日
2	广汽传祺 APP 体验优化项设计	T+35 自然日
3	广汽传祺 APP 体验优化项实施	T+65 自然日
4	广汽传祺 APP 体验优化项走查及二次诊断分析	T+70 自然日
5	广汽传祺 APP 体验优化上线	T+75 自然日

2.5 项目目标

（1）了解本品与竞品 APP 指标表现，基于用户期望与竞品借鉴给出 APP 改进建议，提升客户满意度。构建起一套科学、系统且具有高度实操性的评价体系，为后续的精准评估奠定坚实基础，为广汽传祺在车联网领域的战略决策、技术升级与用户体验优化提供有力支撑与明晰方向，输出 APP 诊断与评价标准，作为后续 APP 迭代与优化的参考标准。

（2）根据设计要求，确保按进度计划完成本项目的实施，支持创新业务、业绩增长业务，同时基于 UI、UX 用户体验提升，系统间交互改善，提升用户使用满意度，提高运营效率，从而助力销量增长。

(3) 构建超伙 KOC 用户线上管控工具,降低运营人员管控 KOC 用户的运营工作,通过超伙 KOC 的培育培训和合作建立紧密的关系,增加核心用户,实现用户价值裂变,增加核心用户,实现用户价值裂变,丰富服务类型,深度挖掘用户价值。同时,简化用户操作路径,提升超伙 PGC 阅读量。

2.6 供应商资质要求

为保证项目的成功实施,供应商必须具有 APP 的定制化开发经验及专业化的项目管理团队、丰富的 App 数据统计分析及系统改善能力。

- 近五年完成同类项目不少于三个。供应商应具有同行业同类项目的经验和相关案例并在技术方案中详细叙述。(在投标时必须提供项目的合同书或提供相关的证明文件)。
- 供应商具有专业化的实施队伍,具有丰富的软件项目实施经验。为保证技术实施服务的质量和长期服务可靠性,不允许联合投标,投标主体必须是唯一。投标单位必须具有良好的商业信誉。
- 为保证实施后系统的正常维护使用,供应商应做好前期调研确保实施后系统符合应用需求。为此供应商由于对招标文件的理解发生误差,没有按招标文件的要求提供全部资料或递交没有对招标文件诸方面作出实质性响应的投标文件,造成投标风险,将由供应商自行承担责任。
- 供应商对技术要求应仔细研究;如有不可行或预期目标不可达到具体应用要求之处,请在标书中提出变更方案,否则其风险由供应商自行承担责任。
- 供应商应提供所使用的软件的原厂商授权证书及服务承诺、供货保证等证明材料。
- 供应商拥有经过实践检验的成功的实施方法经验和理论,拥有完善的项目质量保证计划、项目评估体系计划、拥有完善的项目培训计划。
- 供应商能根据调研能够准确把握、描述和分析用户应用需求,并为用户制定合理的技术处理方案、实施方案。

- 供应商应具备 APP 开发能力，及相关的专业技术人员。

2.7 服务要求

系统功能配套及基础设施为公司业务数字化转型提供支撑，基于保障原有项目的一致性、生产环境的稳定性和服务器环境延续一致性，建议维持原有供应商的连续性，有利于减少后期系统问题的发生，不限于原厂实施开发，云服务器、数据库、云存储、安全服务、监控服务、网络等服务，同时保证各项服务合规，符合法律和监管要求，发现问题服务及时响应处理，保证平台正常运行。

3 项目范围

本项目涵盖广汽传祺 APP（社区、福利、展厅、服务、车联、商城，我的等模块）的用户体验优化设计及实施工作，由于本项目在广汽传祺 APP 基础上进行用户体验优化，不涉及 APP 基础架构的云资源费用变更，因此，本项目不包含现有系统和在原项目基础上进行的改造云资源费用。

注意：正式环境必须内置一个测试渠道，用于正式版本发布后通过该渠道的账号来验证正式环境所有业务的准确性、系统性能/安全层面的可靠性。实施过程中，因业务调整而取消的部分功能开发，对应工作量根据业务部门要求进行置换。

3.1 用户范围

本项目用户主要是广汽传祺 App 的相关用户，以及运营团队成员，主要角色如下：

- 系统管理员：负责整个系统的基本信息及传祺内部用户信息维护；
- 运营人员：负责系统的日常运营工作；
- 用户：日常登录广汽传祺 App 的 C 端用户；

3.2 业务范围

本项目主要结合用户全体验过程，优化提升广汽传祺 APP（IOS，安卓、鸿蒙）用户体验，功能包括以下内容：

1、体验问题分析及调研范围，包含但不限于集团竞赛结果分析、KOC 用户问卷调研分析、内部团队意见反馈分析。

2、设计及实施范围：

(1) 一级页面：展厅、社区（推荐、车友圈、最新、祺享家、资讯）、服务、商城、我的及方案增加一级页面。

(2) 售前场景：车辆详情、试驾、立即订购、心愿单、订单进度查询。

(3) 售后场景：车联主页、我的车辆、售后服务营销触点。

(4) 社区运营：资讯专题主页、活动专区模块、活动日历、社区搜索、超级合伙人及嵌入场景、话题页、发帖子。

(5) 商城模块：商品详情页、商城搜索。

(6) 账户相关：登录、注册、超级合伙人。

3、项目内容：

项目类别	项目内容	目标与要求
1、APP 体验问题 调研	内部调研	- 收集内部 APP 关联部门/团队（包含但不限于业务团队、产品团队、技术团队）体验优化改进建议； - 对所有建议分类归纳，并给出是否采纳及优化应对方案；
	客户问卷研究	- 用户调研、店调研工作、内部调研及结果评审分析 - 洞察从客户知晓到用车的全旅程服务流程的诉求变化，以传

项目类别	项目内容	目标与要求
		祺 APP 为中心, 挖掘线上渠道体验痛点; • 形成基础的 APP 客户基本特征和偏好梳理;
	体验问题总结	• 结合集团竞赛要求, 自查 APP 体验问题, 并给出体验应对方案; • 总结集团竞赛、专家诊断、客户问卷调研、内部调研 4 方面体验问题, 并梳理出对应优化课题
2、APP 体验概要方案	整体体验优化策略	• 明确整体体验优化原则, 以指导界面设计、营销体验、功能框架和产品性能;
	功能框架改造	• 参与整体架构方案设计及指导 • 广汽传祺 APP 顶层框架改善方案、各模块具体功能设计及 UIUX 设计 • 基于体验课题, 降低功能框架层级, 减少客户查找成本; • 结合行业客户认知模型, 全面优化现有信息架构, 帮助客户更好的理解信息关系;
	概要设计方案	• 优化关键页面及流程的交互设计, 形成基础交互语言, 以支撑后续模块交互设计; • 结合行业视觉风格趋势, 优化关键页面及流程的视觉设计, 形成基础视觉设计规范; • 基于 APP 相关部门/团队的共创共识评审, 确定最终可实施

项目类别	项目内容	目标与要求
		上线的方案。
3、APP 体验设计实施推进	营销体验优化	- 结合用户全旅程，协助运营团队梳理营销流程断点； - 对应营销目标需求，优化营销信息传达
	产品性能	- 结合行业体验标准，协助技术团队形成性能评估标准； - 对应弱网加载慢等性能体验槽点，给出体验优化方案；
	交互设计	- 基于用户体验策略和业务要求，全面优化合同范围内的业务流程体验设计； - 交互设计方案要遵循行业交互设计基础原则，如尼尔森可用性十原则，已保障满足用户体验基础要求； - 需和各模块对应业务团队、产品经理及技术团队，共同评审共识最终上线方案。
	视觉设计	- 结合视觉风格策略和运营素材能力，更有视觉冲击力的表现车辆品质和服务体验，全面优化合同范围内的业务流程视觉设计； - 需和各模块对应业务团队、产品经理及技术团队，共同评审共识最终上线方案。
	体验设计规范	基于确定方案，建立 UI 设计规范，以保证后续上线功能体

项目类别	项目内容	目标与要求
		验一致性 • 结合整体设计框架及风格，给出内容配置规格规范
4、开发支撑	设计方案调整	• 确保详细设计方案可开发上线,针对无法开发的设计方案进行调整
	还原走查	• 确保开发实现和最终共识的设计方案一致,针对测试环境的上线情况进行还原度走查。
5、广汽传祺 APP 诊断分析	诊断标准输出	制定车企行业 APP 评分准则与框架体系，输出 APP 诊断与评价标准，作为后续 APP 迭代与优化的参考标准
	本品和竞品分析	本品与竞品 APP 指标表现，基于用户期望与竞品借鉴给出 APP 改进建议，定量与定性调研与诊断评价，用户的招募、用户访谈、用户数据处理、体验报告产出
	广汽传祺 APP 诊断及问题分析	全面诊断广汽传祺 APP 的体验现状，多维度梳理体验优化课题，结合短期快速可实施的目标，提出针对课题的体验优化方案，以确保快速客户体验问题和提升 APP 体验水平。
6、超级合伙人系统优化提升	超级合伙人体验优化	对用户传播,超级合伙人,创作者中心等模块升级,建设 KOC 运营板块与特定权益板块,结合超级合伙人的传播、共创任务,打造打造 KOC 从申请到传播全体系的业务闭环。 • A2 业务中台建设范围 1.统一建设 KOC 身份管理,包括 KOC 类型、预备 KOC、KOC 身份的管理。

项目类别	项目内容	目标与要求
		2.调整权益板块，建设 KOC 专属权益，包括 KOC 生日祝福、活动优先参与权权益服务内容。 3.为前端应用提供 KOC 能力支撑，包括 KOC 的申请、权益的发放、KOC 的查询信息、任务奖励发放。 ● 超级合伙人平台 1.平台任务配置支撑增加私域任务（发帖、评论任务），对接传祺 APP，实现私域任务的发布至完成； 2.超伙运营后台改造，实时监测社区超伙转发数据。 3.增加可以圈选 KOC 这部分人完成任务。 4.新增 KOC 专属页面与专属任务展示。 5.将社区优质帖子文章末尾加入留资模块，纳入超伙传播体系，用户可一键转发并在帖子中留资。 ● 传祺 APP 1.对接超级合伙人平台，实现私域任务的闭环。
7、广汽传祺 APP 体验优化开发实施	展厅模块对 APP 线上销售环节体验优化升级	根据设计方案，完成展厅模块对 APP 线上销售环节体验优化升级。
	超级合伙人模块	根据设计方案，完成超级合伙人模块体验优化升级。
	服务模块	根据设计方案，完成对 APP 线上售后模块升级体验优化升级。
	社区、福利、商城、我的模块体验优化升级	根据设计方案，完成社区、福利、商城、我的模块体验优化升级的实施。

项目类别	项目内容	目标与要求
	车联模块	根据设计方案，完成车联模块体验优化升级。
	VR 模块	根据设计方案，完成对车辆的 VR 展示优化，VR 展厅等模块升级体验优化升级。

根据 2024 年广汽传祺的业务需求，业务范围需包含但不仅限于广汽传祺 APP (IOS, 安卓、鸿蒙) 的改造内容，所有页面交互设计需要进行数据埋点，接入埋点平台，并兼容广汽传祺 APP 旧版本。

3.3 系统上线

系统上线主要任务包括：系统上线推广资料（包括并不限于宣传画、介绍图册、宣传视频等）、用户培训、数据资源整合、系统运行监控过程。

为了保证业务不受影响，需提前做好系统上线应急预案，在特殊情况下，由于某种原因导致系统没有能够正常上线或者上线后系统运行不稳定时必须启动应急预案来解决。

4 技术规范

应用供应商应负责完成本项目的总体方案设计，方案需满足广汽传祺业务量发展规划的需要。以下是总体方案设计中必须包含的内容，应用供应商可依照自身的理解提供更多的必须的服务：

- 应用方案设计，本项目各子系统的功能模块与界面、报表等设计；
- 基础需求设计，含基本需求、HA(High Availability)高可用集群、LB(Load Balancing)负载均衡集群、HP(High Performance)高性能集群、BCP(Business Continuity Plan)业务持续计划、DRP(Disaster Recovery Planning)灾难恢复计划方案等；
- 按照广汽传祺要求进行应用系统集成设计、系统安全方案设计、数据备份与归档策略设计；
- 设计项目实施组织结构与职责；与广汽传祺 IT 基础供应商共同讨论，确定各自的职责范围、分工界面及相互关系，建立清晰的沟通方式和模型；

- 绘制工作分解图，详细描述项目实施中的具体工作及其所需资源。

4.1 应用架构

在应用架构方面需要满足以下要求：

- 应用架构将充分考虑到系统管理和营运架构因素，为复杂的信息系统提供策略层面和设计层面基础；
- 成熟性原则：采用的技术、产品必须经过实践检验，被证明是成熟可靠的，以规避风险。在技术上要到达当前的国际先进水平；
- 7*24 可靠性原则：系统应采用可靠性高的产品和结构，以使系统具有能够保证系统 7*24 小时正常运行的高度可靠性。应采冗余热备份手段和技术，保证设备在发生故障甚至灾难时，能在最短时间内恢复，以最大程度地保证数据安全和业务的正常运转；
- 安全性原则：根据广汽传祺的管理制度和策略制定一套完善的安全政策，采用合适的技术手段，充分保证系统安全性；
- 可扩展性原则：系统应具有良好可扩展性，随着业务的增长和应用水平的提高，系统应可平滑的扩展和升级，而不需要对系统结构和设备进行大的改动。
- 系统的性能要求：
 - a. 业务操作响应时间：≤2 秒；数据查询和报表生成系统响应时间≤10 秒；
 - b. 应用服务器/数据库服务器日常资源消耗≤60%；
 - c. 系统用户数不限；经销商业务管理系统并发用户数能支持 1000 个；销售公司业务管理系统并发用户数能支持 200 个；终端用户并发数能支持 100,000 个；
 - d. 软件设计要求能够支持 1000 家经销商，年产销 100 万辆车，保有量 1000 万辆车；
 - e. 用户可进行单点登录（登录一次就能使用允许范围内的所有模块）。

4.2 配置管理

供应商必须建立完整的配置管理体系，实现以下功能：

- 从开发环境、测试环境到生产环境的平滑迁移，迁移过程中，现有业务不受影响。开发、测试和生产环境进行网络隔离，生产环境下的权限应进行严格控制，开发测试人员严禁拥有生产环境权限；
- 各应用环境内置版本管理功能，根据需要，可以随时切换到任何一个版本；内置 change log 功能，可对任意两个版本的代码进行比对；
- 应对信息系统未来的容量、功能和性能等要求进行充分评估和预测，要考虑广汽传祺现有信息系统容量的当前状况和未来发展趋势，为广汽传祺的数字化营销服务平台硬件资源制订 5 年规划。

4.3 系统安全

在系统安全性方面，必须支持以下功能：

- 基于角色的权限控制，用户操作审计；
- 系统可用性的保护级别设计到各个层次：操作系统、硬盘、数据库、应用软件以及中间件，任何一台主机、存储或部件、以及其上的软件发生故障甚至广汽传祺机房放置的设备突然被毁坏而无法正常使用服务时，能有另外一套来提供基本服务，从而不影响广汽传祺的业务；
- 硬件设备支持在线资源调整，不影响系统正常运行；网络应确保不受到来自于外部网络的非法访问和攻击；
- 交付的软件系统需要通过国家级 3 级等保测评，评测过程中出现整改项供应商必须无条件整改，并能支持最新企业版防病毒软件 SEP（SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION）当前最新版本；

- 供应商使用的所有工具软件必须保证是正版软件，包括并不限于：开发平台、版本管理工具、项目管理工具、需求管理工具、Bug 管理工具、各种测试工具、办公软件以及第三方组件等；
- 文档/数据/日志备份及归档：项目实施过程文档/数据/日志都应该有备份及归档管理，包括并不限于：项目管理文档、系统开发设计文档、源代码、系统配置文件、系统日志、应用日志、操作日志、接口日志等，同时提供系统运行平台的 5 年资源规划，所有文档/数据/日志都能随时调取以备审查；
- 用户管理安全性：强制密码更改、按组织角色分配权限及数据管理范围；广汽传祺内部用户必须集成域帐号。

4.4 系统集成

在系统集成方面，供应商必须提供以下产品和实施服务，根据供应商自身的理解与项目实施需要，供应商有义务提供更多必须的产品与服务：

- 应用系统集成方案设计，IT 基础设计，提出对于数据库、服务器、存储、备份/归档的需求；
- 应用系统集成需求分析与调研，AS-IS 文档制定；
- 负责制定跨应用系统业务流程集成 TO-BE 方案与文档；
- 根据 TO-BE 方案完成客户化开发，并在客户化开发过程中培训广汽传祺项目成员实现系统架构、开发技术等知识向广汽传祺的转移；
- 负责用户培训与开发培训，完成知识转移；
- 系统设计必须遵循可扩展性原则：系统应具有良好可扩展性，随着业务的增长和应用水平的提高，系统应可平滑的扩展和升级，不需对集成接口进行 10%以上的改动。

系统集成的设计应遵循面向服务的整体框架标准，使用网络服务作为主要的接口沟通标准。

- 所有接口均可后台配置自动/手动触发模式，自动模式可配置接口频率；
- 所有接口均可通过线下拷贝数据模式实现网络完全中断情况下的数据交互；

- 所有接口均需保留所有原始接口数据，接口双方共同商讨数据重发/重处理机制；数据提供方提供数据重发机制，数据接收方提供数据重处理机制，同步评估原始接口数据保留期限；
- 所有接口日志必须保证完整，包括并不限于接口方、接口调用时间及持续时常、接口数据及处理结果等，同步评估接口日志保留期限；
- 所有接口需提供握手协议，协议用户和密码由接口提供方维护；
- 所有接口规格书由接口提供方提供，调用方补充确认后由广汽传祺通过评审后三方签批；
- 所有接口必须提供预报警机制，接口出现问题时能及时通过短信/邮件/微信/APP 等各种即时沟通工具通知指定管理人员；
- 所有接口日志、接口数据均需在后台实现查询导出功能；

4.5 技术要求

项目要求统一采用微服务架构并实现 DEVOPS，相关技术要求如下：

- 微服务架构：限定使用微服务技术架构，供应商必须搭建/部署完整的微服务开发平台；软件使用授权为无限用户数，源代码交付，并且广汽传祺有权使用和修改源代码；
- DEVOPS 平台：全面的微服务发布运维平台（项目管理、代码管理、工程管理、持续集成&交付、容器化、服务调度、企业仓库、灰度发布、监报告警），提供 WEB 界面形式的运维管控平台，可以一站式完成对应用进行生命周期管理；
- 开发平台：支持 Linux/Windows 操作系统；支持市场主流的数据库管理系统如 Oracle、SqlServer、MySQL；
- 应用平台：应用端支持 Windows 10 及以上操作系统，支持 Android/IOS/HarmonyOS 等主流移动平台；服务器支持主流 Linux/Windows Server2016 及以上操作系统；支持 Tomcat、

Websphere Application Server、Weblogic Server、IIS 等主流应用服务平台；支持主流浏览器：Chrome、Edge 2021 以上等；

- 中间件应该是通用的、市场化、成熟的商业产品，其安装、运行和使用与平台无关，无需额外条件限制；
- 其他要求：支持公有云部署，应考虑公用云与私有云双向同步及迁移的需求。

4.6 知识产权

所有交付文档和开发源码（包含所有直接或间接的在合同范围内的开发或优化）版权归广汽传祺所有，包括但不限于修改、变更。

供应商应保证本合同项下的知识产权不会侵犯任何第三方权利，若广汽传祺因此受到第三方侵权索赔，供应商应当承担一切经济和法律上的责任，并赔偿广汽传祺因此而蒙受的包括但不限于处理纠纷而支付的律师费、诉讼费、差旅费、赔偿金等全部损失。

5 项目管理

供应商应负责本项目的项目管理工作，供应商在本项目中应提供的项目管理服务必须包括但不限于以下内容：

- 供应商应指定专职的项目经理，建立项目团队，形成项目小组，与广汽传祺及项目实施中相关的 IT 基础管理部门、设备供应商紧密合作；
- 供应商的项目经理，作为项目整个实施过程中单一联系人，简化信息流的管理，并提供对项目的有效管理；
- 制定项目计划与进度管理方案，并负责项目计划与进度管理；
- 制定交付物管理方案，并与广汽传祺共同负责交付物管理；
- 制定项目风险管理方案，负责项目风险管理；
- 编制各子系统开发管理方案、测试方案与用例；

- 监督项目实施的进展状况，纠正项目执行的偏差；
- 与广汽传祺协作，对项目需求与变更进行管理；
- 与用户定期共同对项目的执行结果进行分析和评价，确保项目达到既定目标，确保相关任务成功完成；
- IT 基础、设备供应商及其相关人员将作为一种资源投入到本项目，由本项目的应用供应商对项目计划与实施进度进行管理。
- 应用供应商在实施过程中提供以下软件工具必须合法：
- 项目计划与进度管理工具；
- 项目需求与变更管理工具；
- 风险管理工具；
- 压力测试与 BUG 管理工具；
- 软件开发平台；
- 实施系统必须的第三方软件；
- 实施系统所必须的中间件，广汽传祺将对供应商的中间件进行评估，如果认为不适合的，广汽传祺有权要求应用供应商更换为通用的中间件。

5.1 RASIC

项目活动采用以下 RASIC 矩阵表进行职责定位：

- R-责任(Responsible)：负责执行任务；
- A-批准(Approve)：负责批准任务执行，任务的责任人；
- S-支持(Support)：提供信息支持；
- I-通报(Inform)：应该及时知情的人员/团队；

➤ C-咨询(Consult)：拥有完成该任务所需资源的人；

序号	活动	类型	供 应 商	业务 部门	IT	成果/交付物
1	项目计划	项目管理	R	SC	A	总体规划(日程表)
2	建立管辖性机制	项目管理	R	SC	A	工具、交付件模板改进、报告周期、项目组织、规程、问题清单、任务清单
3	定义工具和项目模板	项目管理	R	SC	A	模板和项目规程
4	项目启动	项目管理	R	SC	A	项目启动汇报文档
5	跟踪项目风险和问题	项目管理	R	SC	A	更新的问题/风险清单
6	定义负责人、技术对象加密规则、开发环境传输	系统设计	R	SC	A	系统布局图和开发环境管理规程
7	详细业务蓝图	系统设计	R	CA	SC	业务蓝图及其汇报文档
8	定义数据迁移和清理方式	系统集成	R	SI	A	数据迁移策略
9	软件实施项目系统配置	系统集成	R	SI	SA	配置系统
10	企业架构设计	系统设计	R	SC	A	业务架构、应用架构、数据架构和技术架构
11	系统详细设计	系统设计	R	SA	C	软件项目系统详细设计

序号	活动	类型	供 应 商	业务 部门	IT	成果/交付物
12	界面设计	系统集成	R	SA	C	完整人性化的的界面
13	定义集成测试案例	系统集成	R	S	CA	测试案例
14	集成测试执行	系统集成	R	SI	SA	测试报告
15	定义用户测试案例	系统测试	R	SC	A	测试案例
16	执行用户测试	系统测试	SC	R	A	测试报告及问题清单
17	定义性能/安全测试案例	系统测试	R	SI	CA	测试案例
18	性能/安全测试执行	系统测试	R	A	CA	测试报告
19	培训课程规划	培训	R	SC	A	课程目录及计划
20	准备用于培训的数据	培训	R	SC	A	数据清单、系统可用性
21	培训执行	培训	SC	R	A	培训评价表
22	实施生产环境	技术架构	R	S	A	系统环境可用性
23	数据迁移	系统部署	R	S	A	对用户认证进行详细结果分析
24	上线支持	系统运维	R	S	A	系统运维报告

5.2 人员管理

项目团队需要有专业的项目总监、项目经理、开发团队（包括开发主管、系统架构师、DBA、开发人员）、测试团队、运维团队、业务顾问团队。所有项目团队成员必须有 3 年以上工作经验，关键岗位人员需要通过广汽传祺面试合格后方可加入项目组。所有项目团队成员因特殊情况需要更换人员的，需要征得广汽传祺同意；同时供应商需要在离岗人员正式离岗一周前提供同等条件人员通过广汽传祺面试并正式上岗，离岗人员和替岗人员交接一周后离岗人员才能正式离岗。

供应商必须提供将投入该项目的组织机构及人员构成以及各项目主要成员的简历（包括人员基本信息、学历信息及其证明文件、工作经历、汽车行业项目信息及其证明文件、专业资质证书），同时提出对本项目的业务人员和 IT 人员的参与建议，包括参与度、职责等。

供应商在投标文件中应明确本项目的人员投入计划（计划的粒度到每天，投入人员按人/天计算）和实施办公环境要求。项目启动之后，按照应用供应商的人员投入计划到岗（关键岗位需要通过广汽传祺面试）。关键岗位人员要求如下：

角色	定位和要求
项目总监	定位：项目总体把控，项目总体计划、资源协调、关键决策； 参与阶段：至少参与里程碑汇报、重要专题讨论； 人员要求：10 年及以上行业经验和项目管理经验，具备丰富的车企软件实施项目管理经验、团队管理和资源协调经验；有高超的问题风险管控和课题解决方案决策能力。对本公司产品、平台、资源非常熟悉。
项目经理	定位：项目具体负责人，组织、协调、管理项目相关工作； 参与阶段：全职全程参与； 人员要求：10 年及以上行业经验和项目管理经验，至少有实施过 2 个汽车行业销

角色	定位和要求
	售领域软件实施项目经验；沟通协调能力强，能协调相关业务部门、IT 部以及软件项目供应商的具体工作；具有很强的文档能力和向上汇报能力。对本公司产品、平台、资源非常熟悉。
架构师	定位：蓝图设计，业务架构、应用架构、数据架构、技术架构； 参与阶段：至少参与蓝图设计、上线准备阶段； 人员要求：10 年及以上软件实施行业工作经验，3 年以上企业架构经验，对整车销售公司业务需求和业务场景有深刻的理解；具有很强的企业架构规划能力、业务流程建模能力、信息数据结构设计能力、技术架构选择和实现能力、应用系统架构的解决和实现能力、基础 IT 知识及基础设施、资源调配能力、信息安全技术支持与管理保障能力、IT 审计治理与基本需求分析获取能力、面向软件系统可靠性与系统生命周期的质量保障服务能力。对本公司产品、平台、资源非常熟悉。
开发主管	定位：项目开发资源协调、技术难题公关、开发计划和资源把控； 参与阶段：全职全程参与； 人员要求：10 年及以上软件系统开发经验；精通 JAVA 平台开发架构和相关工具，精通微服务架构及相关工具，精通 DevOps 平台搭建及治理；具备很强的开发团队管理能力，能协调开发资源，合理制作开发计划、需求分析；对本公司产品、平台、资源非常熟悉。
DBA	定位：保证数据库管理系统的稳定性、安全性、完整性和高性能； 参与阶段：全职全程参与； 人员要求：5 年及以上相关工作经验，精通项目所采用的数据库管理系统的配置、

角色	定位和要求
	开发、优化；对本公司产品、平台、资源非常熟悉。负责数据库管理系统的搭建和运维。
测试主管	定位：需求分析、测试计划、测试用例、测试报告、缺陷分析、软件质量； 参与阶段：至少参与蓝图设计、项目实施、上线准备、试运行阶段； 人员要求：5 年及以上软件系统测试经验。对业务需求、业务场景有深刻的理解。熟悉微服务架构、DevOps 平台及其相关工具，精通各种自动化测试工具。良好的文档编写能力，提交符合标准要求的测试报告。丰富的问题分析和管理能力，对测试中发现问题进行详细分析和准确定位，与开发人员讨论缺陷解决方案。对本公司产品、平台、资源非常熟悉。
UI 设计师	定位：UI 设计、系统原型、页面优化； 参与阶段：至少参与蓝图设计、上线准备阶段； 人员要求：5 年及以上软件应用系统 UI 设计经验。对整车销售公司业务需求、业务场景有深刻的理解，负责系统界面的设计和制作，提交符合业务满意的解决方案；根据业务需求，提出新颖符合操作习惯的设计；对页面进行优化，使用户操作更趋于人性化；收集和分析用户对于 GUI 的需求并实现。
业务顾问	定位：行业顾问； 参与阶段：至少参与蓝图设计、上线准备、试运行阶段； 人员要求：资深汽车销售领域行业顾问，10 年及以上汽车行业销售领域工作经验。对业务需求、业务场景有深刻的理解和系统实现的把控，能够将管理信息化解决方案成功地实施、应用到实际业务流程中去，并能持续提出符合最佳实践的建议和改

角色	定位和要求
	善方向。
汽车行业高级顾问	定位：需求分析、用户访谈、数据洞察、竞品对比分析等 参与阶段：产品设计阶段 人员要求：至少 5 年以上相关车企经验，需精通汽车行业各类业务流程，包括但不限于汽车研发、生产制造、市场营销以及售后服务等环节。具备敏锐的市场洞察力，能够精准捕捉行业动态与趋势，为项目提供前瞻性建议。熟练掌握多种数据分析工具与方法，以高效处理与深度挖掘海量数据信息。拥有出色的沟通协作能力，能与车企内部各部门以及外部合作方进行顺畅有效的沟通交流，协调资源推动项目进展。具备优秀的报告撰写与演示能力，可将复杂的分析结果与建议以清晰、简洁且富有说服力的方式呈现给客户高层决策团队。同时，需有成功主导或深度参与多个汽车行业大型项目的经历，在项目中展现出卓越的问题解决能力与创新思维，能够针对不同车企面临的复杂挑战制定个性化且切实可行的解决方案。
用户体验设计工程师	定位：用户体验设计； 参与阶段：全职全程参与； 人员要求：5 年以上用户体验工作经验； 1.可独立跟用户/系统工作的整个流程，为产品提供用研支持。根据业务情况制定合理的用研规划，将用研工作与产品开发过程紧密连接； 2.独立完成项目的全套流程，包括需求沟通与分析，研究方案设计，调研项目

角色	定位和要求
	管理与实施，数据分析，报告撰写、输出、汇报，研究结果推动落地等； 3.研究内容包括但不限于：用户群体的行为或态度分析、产品 DEMO 版本用户体验验证、可用性测试、满意度研究、服务设计体验评估等。 4.系统用户体验走查和回归测试。

5.3 版本管控

通过管理软件项目的存储目录、分支、权限、维护等内容，使软件项目版本管理流程化并规范化，确保在系统开发和实施过程中项目的完整性和一致性。具体要求如下：

- 项目中所有正式文档和代码都需要纳入配置库（可使用工具建立配置库）进行版本管理。
- 配置管理员（可由项目组成员兼任）负责定期检查各项目对版本管理规范的执行度，根据发展需要对规范进行完善。
- 保留所有开发版本，可在多个版本间进行平滑切换，且不影响正常业务。并制定回退计划、建立变更的审批流程、向相关人员传达变更的内容与影响等。

另外，在版本管理中，需要做好如下几类数据备份，并确保能够使用备份数据恢复被损坏或丢失的业务数据，保证业务系统数据的完整性和可用性。

- 完全备份：将数据库的全部信息进行备份，包括数据库的数据文件、日志文件，还需要备份文件的存储位置以及数据库中的全部对象和相关信息。
- 差异备份：备份从最近的完全备份后对数据所做的修改，备份完全备份后变化了的数据文件、日志文件以及数据库中其他被修改的内容。

- 事务日志备份：备份从上次备份过后的日志文件，记录了用户对数据进行的修改操作。为了避免备份日志的容量占满整个磁盘，必须定期清除掉不必要的记录，以节省空间。清除无用日志记录的过程叫做截断日志。
- 增量备份：备份上一次备份后所有发生变化的文件。在增量备份过程中，只备份有标记的选中的文件和文件夹，它清除备份后标记的文件

5.4 计划管理

在项目实施过程中，应准备好所有基于项目管理计划、问题、需求、任务分配的工具；供应商应当提供项目实施的详细周计划；在实施过程中应当提供项目数周以后的实施计划，并且要每周产生项目实施报告。

5.5 风险管控

合理地使用各种风险应对措施、管理方法技术和手段，对项目的风险实行有效的控制，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。

- 在报价文件中，供应商应当提供风险确认以及风险应对措施。
- 实施过程中，能有预见性地提出实施风险管理方案以便在项目过程中对风险事件做出回应，通过对风险的识别、分析来评价这些不确定性，从而向项目范围管理提出任务。当变故发生时，需要重复进行风险识别，风险量化以及风险对策研究一整套基本措施。

5.6 质量管控

供应商应负责建立项目质量保证体系，设计必备应对措施、方法和体系以保证项目实施的质量并且要负责项目实施过程中的质量控制。项目启动后，供应商需要按要求提交如下文档：

序号	内容	频次	方式	汇报层级	阶段
----	----	----	----	------	----

1	项目日报	每天	邮件	项目经理	项目全程
2	项目周报（含汇报）	每周	会议	项目指导委员会	项目全程
3	项目月报（含汇报）	每月	会议	项目指导委员会	项目全程
4	里程碑评审（含汇报）	按需	评审会议	项目指导委员会	各里程碑节点

项目实施过程中，如果发生问题需要在 24 小时内解决或反馈解决方案，若解决不了需将问题升级至项目委员会协调处理。

5.7 测试管理

项目测试包括单元测试、集成测试、用户测试、性能/安全测试；测试团队负责项目整体测试方案并提交项目组评审，根据通过评审的测试方案准备测试用例、测试脚本和工具，执行测试并提交合格的测试报告。用户测试用例需要对应需求清单编号，按照使用场景来编写测试用例并得到广汽传祺评审，测试报告需要得到用户签批。集成测试、性能/安全测试用例及测试报告均需得到广汽传祺 IT 团队的评审和签批。在项目报价中应当包含由厂区外测试所产生的花费。主要测试工作包含：

- 需要根据测试计划搭建和维护测试环境；
- 执行测试工作，提交符合标准要求的测试报告，包括编写用于测试的自动测试脚本，完整地记录测试结果，编写完整的测试报告等相关的技术文档；
- 对测试中发现的问题进行详细分析和准确定位，与开发人员讨论缺陷解决方案；
- 提出对系统的进一步改进的建议，并评估改进方案是否合理；
- 对测试结果进行总结与统计分析，对测试进行跟踪，并提出反馈意见；
- 为业务部门提供相应技术支持，确保软件质量指标。

在测试阶段，将使用以下严重性级别对所有缺陷进行分类：

严重程度	影响	例举
1-特别严重	防止所有测试继续进行的事件。所有测试暂停	法律不合规 受影响的用户数量超过 30% 负载受影响/计算不正确 没有实际的解决方法
2-较严重	事件严重影响测试，但测试能够继续（可能有解决方法）。测试或特定功能可能会被暂停	重要/完整的业务领域的功能没有正常工作 解决办法在实时操作中不可持续
3-严重	事件的不便之处在于测试进度。测试能够继续而没有太大影响单个功能中的测试可能会被暂停测试脚本错误，需要修复	可操作的解决方案，操作影响低 缓解流程容易实施
4-不严重	对测试进度影响不大的事件。受影响的用户很少 非常低的运营影响	受影响的用户不超过 5% 非常低的运营影响 简单的屏幕布局问题 拼写错误

软件的接受度将以严重程度级别的缺陷数量来衡量，其中集成测试、性能/安全测试必须完全满足项目技术规范。单元测试、集成测试和用户测试成功完成测试阶段允许的可接受的缺陷数量是：

严重程度	单元测试	集成测试	用户测试
1	=0	=0	=0

2	=0	=0	=0
3	<10	<10	<10
4	<20	<20	<20

5.8 变更管理

供应商必须对版本发布严格管理, 版本发布需遵守广汽传祺变更管理制度中的相关规定。对组织、业务流程、信息处理设施和系统中影响信息安全方面的变更应加以控制。控制措施包括建立变更方案、进行变更测试、评估变更的潜在影响并制定回滚计划、建立变更的审批流程、向相关人员传达变更的内容与影响等;

全部项目变更(需求新增/需求变更/需求减少)必须得到项目组(双方项目经理及以上级别)批准。汇总后的需求变更在项目总金额 10%之内的由项目组签批, 且不需要额外支付费用; 超过总金额 10%的费用则需要在得到项目指导委员会评审后协调处理。

5.9 保密协议

供应商应对广汽传祺提供的技术资料 and 价格保密, 应对项目过程中所涉及到的所有信息数据如: 发展规划、业务数据、财务数据、生产工艺、投资、设备等保密。

双方所承担的保密义务不以本规格书的失效而失效。

6 项目交付

6.1 交付物

项目预期交付物如下:

交付阶段	No	交付物	备注
General	1	交付物说明文档	包括交付物编码规则、名词解释及交付物清单
	2	会议纪要	
	3	日报/周报	评审报告主要指项目里程碑评审报告
	4	里程碑/课题评审报告	
	5	课题管理表	包括问题、风险和课题，实时更新
	6	工作说明书	
蓝图设计	7	需要调研方案	需求调研课题、调研计划
	8	需求说明书	需要被调研人员签批，包括技术难点测试报告
	9	业务蓝图	里程碑文档，需要签批到项目执行委员会
	10	系统设计	
项目实现	11	详细设计	
	12	数据库设计	包括主数据编码规范，需要广汽传祺技术担当签批
	13	源代码	
	14	集成测试报告	
上线准备	15	性能/安全测试报告	

交付阶段	No	交付物	备注
	16	用户培训测试报告	包括问题清单及解决情况、用户考核记录
	17	修订的制度/流程	包括项目管理、系统运维管理和相关的业务流程
	18	系统安装配置维护手册	包括故障诊断手册
	19	系统使用手册	
项目收尾	20	上线运行报告	上线 30 天后一周内提供
	21	运维交接报告	包括交接方案、交接计划、知识转移、交接考核
	22	系统效果分析报告	功能/性能/系统安全等
	23	项目验收报告	
系统运维	24	系统运维日报/周报	
	25	系统运维月度总结报告	
	26	系统运维验收报告	
体验问题调研	27	APP 诊断标准	1.车企行业 APP 评分准则报告 2.广汽传祺 APP 深度诊断报告 (本品 APP 指标表现, 竞品 APP 指标表现、本品用户使用满意点与不满意点, 本品 APP 改善方向 “基于用户期望与竞

交付阶段	No	交付物	备注
			品借鉴给出”)
	28	诊断报告分析文档	包含问题归类及对应优化方案
	29	KOC 用户问卷调研分析文档	包含 KOC 基本数据分析、反馈问题归类及对应优化方案
体验概要方案	30	功能框架方案	包含优化前现状和优化后方案的功能架构脑图对比
	31	关键页面 UX/UI 设计方案	包含展厅、车详情页、社区推荐、服务 4 个页面的 UX/UI 设计方案
	32	关键流程 UX/UI 设计方案	包含下订配置流程的选版本、选外观、选内饰、选权益 4 个页面的 UX/UI 设计方案
体验设计实施	33	交互设计文档	合同优化范围内的设计定稿, 包含 sketch 及 PNG 格式
	34	视觉设计文档	合同优化范围内的设计定稿, 包含 sketch 及 PNG 格式
	35	体验设计规范	UI 设计规范及运营配置规格要求, 包含 sketch 及 PDF 格式
系统走查清单	36	体验还原走查问题清单	合同优化范围内的上线走查, 包含问题描述、截图及后续验收结果的在线表格文档

交付物说明:

- 1). 序号: 所有文件交付物应该按规则排序;
- 2). 文件格式: 通用文档用 WORD 格式, 演示文档用 PPT 格式, 表格文档用 EXCEL 格式;
- 3). 介质: 所有的文件要有电子文档, 所有需要签名的官方文件应该有四份;

6.2 知识转移

供应商不仅要为广汽传祺的主要业务人员提供相关业务培训以保证主要业务人员能够掌握软件应用，而且也能培训广汽传祺其他员工。培训老师必须熟悉系统并对业务流程有很深入的了解。在培训过程中，应有解释说明和实际的操作示范以确保用户实现从理论的概念到实践的认知过程，确保用户熟练地操作系统。供应商必须提供详细的培训方案，具体的培训时间和地点由广汽传祺和供应商协商确认。广汽传祺提供培训设备，并负责培训安排。培训形式包括现场指导和网上学习（由此产生的培训费用已包含在此项目的报价单中）。供应商在培训之前为广汽传祺准备“用户手册”并发放电子培训材料，培训具体要求如下：

序号	培训类型	次数	培训内容/方式	培训目标
1	技术培训	5 轮	系统安装配置、系统维护及故障诊断；集中培训；	技术维护人员可以独立完成相关的技术工作；
2	用户培训	5 轮	业务操作/系统配置培训； 集中培训；	培训者能够熟练操作系统，而且能够给其他人做用户培训。

6.3 运维交接

系统验收前必须完成运维交接并保证运维团队具备系统运维能力，运维交接内容包括：

- 运维团队培训考核：运维团队能独立完成系统安装、配置、运维及故障诊断工作且必须通过广汽传祺考核；
- 运维方案制订：系统点检方案、系统软硬件升级方案、系统数据/日志归档方案、系统变更方案、问题处理流程等；

6.4 运维/质保服务

本项目要求自项目验收后算起的 12 个月运维服务；在运维服务期内，根据项目需要安排至少一名运维工程师现场或远程运维，该工程师必须是全程参与项目实施的工程师并必须通过广汽传祺面试；现场运维服务期内提供的任何服务（包括现场运维人工费用、维护作业、BUG 修正、问题解决和使用支持）均不得另行收取任何费用；现场运维服务期后的质保费、远程运维费、现场运维费用另行约定，但必须提供的服务包含并不限于：

- 提供软件包的升级补丁、升级软件，并协助广汽传祺进行更新；
- 提供 7*24 小时电话、即时通讯软件、邮件远程的专人支持，问题等响应必须实时响应，响应时间超过 5 分钟必须向广汽传祺负责人当面解释，每个月出现一次响应时间超过 30 分钟供应商项目总监必须在月度例会上现场解释；
- 对于系统故障，通过远程支持，必须在 2 小时内解决；2 小时内不能远程解决的，要求在 4 小时内到达广汽传祺现场进行处理；
- 每年提供不少于 40 学时的技术培训服务；
- 如果现场运维团队变更，必须预留一个月交接期，交接期运维团队必须向新团队进行运维交接并得到广汽传祺签批，交接内容参见 **6.3 运维交接**；

6.5 验收标准

满足以下所有内容后，项目允许运行进行验收：

- 所有交付物都已经提交并通过广汽传祺评审（特别说明：该项同时是各里程碑验收标准）；
- 系统上线以后，应满足以上所提到的所有功能，并且所有功能必须得到用户部门的书面确认；
- 系统上线以后，生产环境数据应当满足广汽传祺的所有数据规格，并且必须是准确的；
- 运维交接完成签批；

- 本地化运维支持能力，必须有本地化服务机构与团队并做说明。

6.6 进度保证条款

供应商应提供足够的资源以保证项目按计划进行并按里程碑节点提供通过评审的交付件；如不能按时交付，每个里程碑节点延期超过 30 天后每延期一天需要扣除合同总金额的 0.05%，且无上限直至扣光未支付合同款（经过项目委员会批准的特殊情况除外）。项目实施过程中，任何一个里程碑节点延期超过 30 天，广汽传祺有权进行单方终止合同并要求供应商赔偿损失。里程碑节点以本文档中 **2.4 进度计划** 为准，延期天数的计算以自然日为准（包括周末及法定节假日）。

供应商必须按计划准时安排符合要求的项目团队成员入场，如有违反按人次计违约数量；项目团队成员进场必须遵守广汽传祺各种规章制度（首次进厂广汽传祺项目团队会进行相关培训），如有违反视同广汽传祺员工同等处罚并按人次计违约数量。以上每人次违约需要扣除合同总金额的 0.1%且无上限直至扣光未支付合同款（经过项目委员会批准的特殊情况除外）。

现场运维期间，如果无法按要求提供服务，必须提供正当理由并由项目总监向项目指导委员会报告，否则按次计算违约，每次违约需要扣除合同总金额的 0.1%且无上限直至扣光未支付合同款。

6.7 付款条件

本项目以开口方式推进，最终以实际签批需求对应双方确定的服务内容及对应工作量进行结算，结算周期为每两个月/次，验收后支付 100%。（实施期至 2026 年 3 月 31 日止，最终以合同签订及实际需求为准）

